

- ☐ 氷見市ふるさと整備課 御中
- ☐ 令和5年度
- ☐ 森寺地区

能登半島地震被災対応について R6. 1. 21

報告・要望書

森 寺 自 治 会



森寺 能登半島地震被災対応 R6.1.21

被災分類	箇所	窓口	対応方針	備考（その後の経過等）
安全対策	市道に面した安全対策 コーン等	道路課、地域振興課	道路課でダメなら地域コミュニティ可能か	
地滑り指定	家裏斜面亀裂	氷見土木砂防班	報告	
県道関係	交差点付近亀裂	氷見土木道路班	報告	
土地改良施設	① 国営パイプ破損？	ふるさと、氷見土木	報告	
	② ポンプ場階段亀裂、機械関係	ふるさと、氷見土木改	報告	
	③ 森寺用水 水路橋	ふるさと	要望	
	④ 子谷田排水	ふるさと	要望	
	⑤ 取水堰吐口取付	ふるさと	要望	
市道・広域農道	① 向出橋段差	道路課	報告	
	② 広域農道沈下亀裂	道路課、ふるさと	報告	
	③ 広域農道森寺橋段差	道路課、ふるさと	報告	
	④ 親田川橋陥没	道路課	報告	
	⑤ ポンプ場横橋段差	道路課	報告	
	⑥ 西念寺方面坂	道路課	要望	
	⑦ 城山線斜面崩落	道路課	報告	
	⑦ 城山線路肩崩落	道路課	要望	
公民館	① 公民館瓦	地域振興課	地域コミュニティ9割補助 平瓦含めても再見積もりして要望	
	② 第2公民館瓦	地域振興課	地域コミュニティ9割補助 現見積りにて要望	
	③ 水銀灯傘落下	地域振興課、又は 自前修理	自前修理不可なら電気屋に見積。地域コミュニティ9割補助 以上3件一括で補助金300万（工事費333万）以内	
愛宕神社	① 鳥居損壊	自治会、総代	見積り依頼中	見積り額、既存財源、優先度、不足財源確保、神社庁からの支援の有無、氏子の総意、寄進者遺族の意向などを慎重に検討。生活再建途上、高齢化所帯の増加などにも配慮。
	② 灯籠損壊	自治会、総代	見積り依頼中？	
	③ 狛犬、標柱、本殿、奥殿（雨漏り）他	自治会、総代	点検確認？	
その他	① 三保池堤倒木	水利組合	自前処理	
	② 電柱横倒 森寺支3 3100 8L	区長	北電電	

森寺 能登半島地震被災箇所 安全確保対策


コーン、コーン繋ぎ棒の支給支援

市道に面した家屋の損壊、屋根瓦のズレ落下などから往来の安全を図るため、早急に上記の資材の支援を頂ければありがたい。若しくは道路管理者の方で要望箇所に対処していただければなおありがたい

約5棟×4ヶ 20ヶ程



森寺 能登半島地震被災箇所 県土木地滑り指定関係

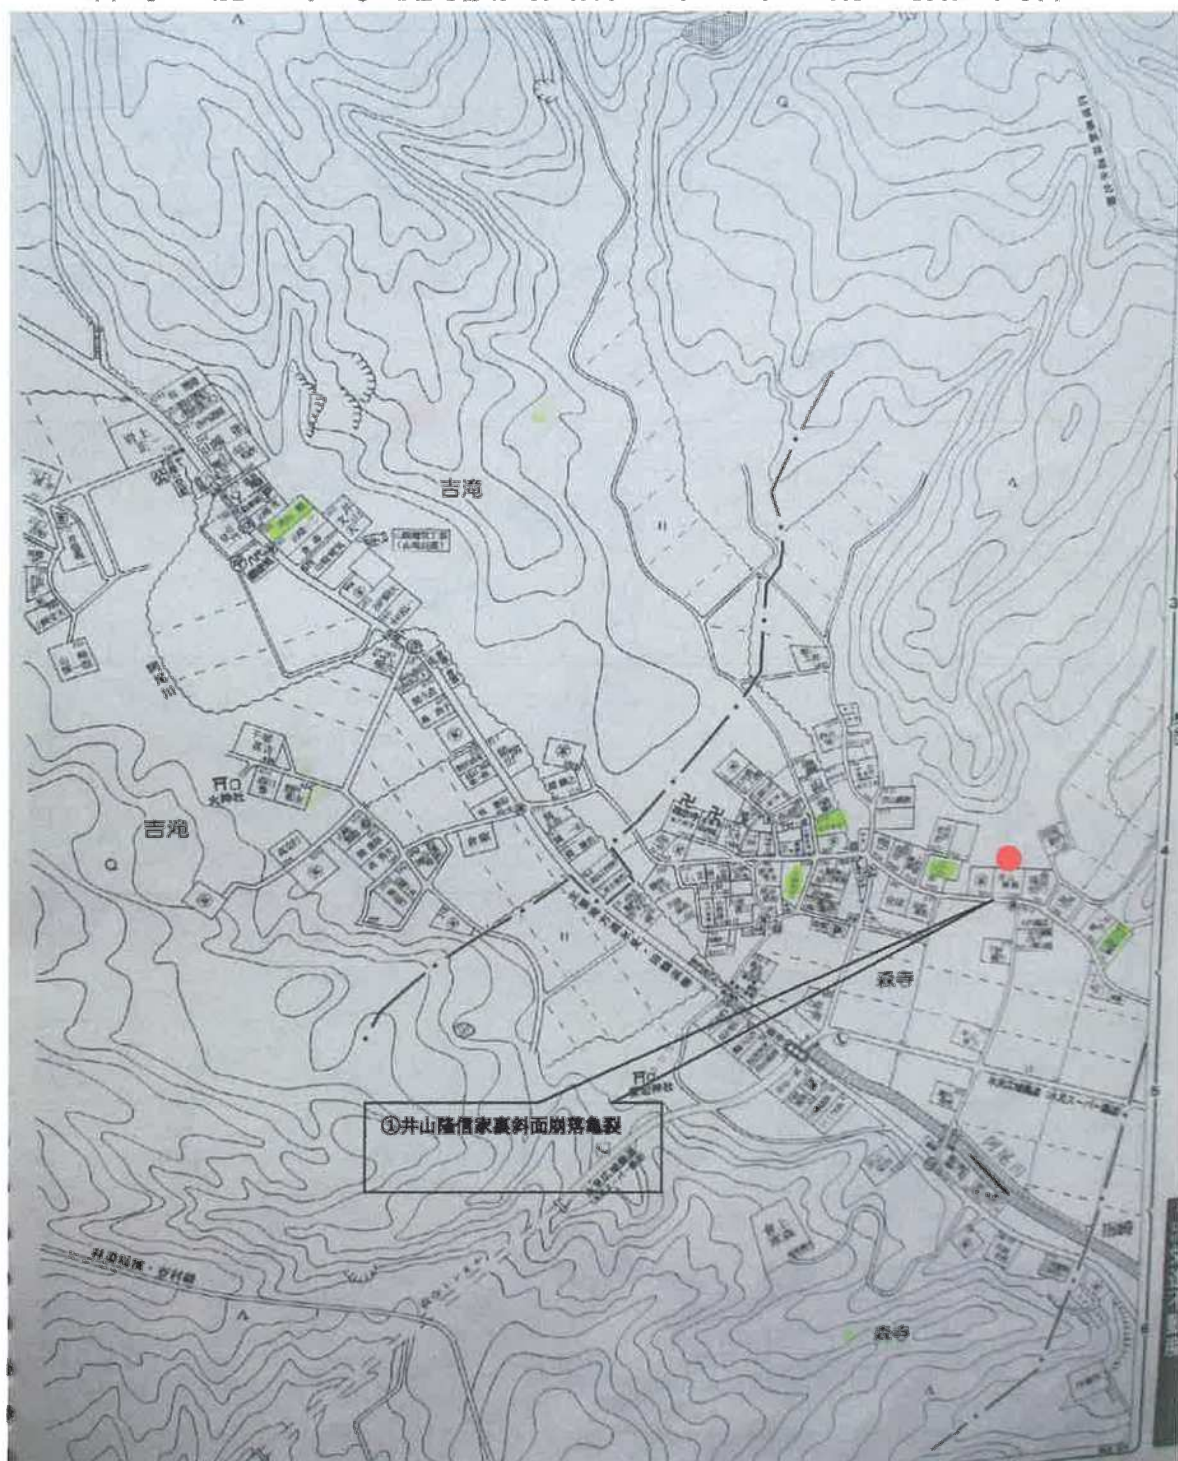


森寺 能登半島地震被災箇所 県土木地滑り指定関係



① 家裏斜面崩落亀裂
幅薬剤30m、高さ約10m
約

森寺 能登半島地震被災箇所 県道関係

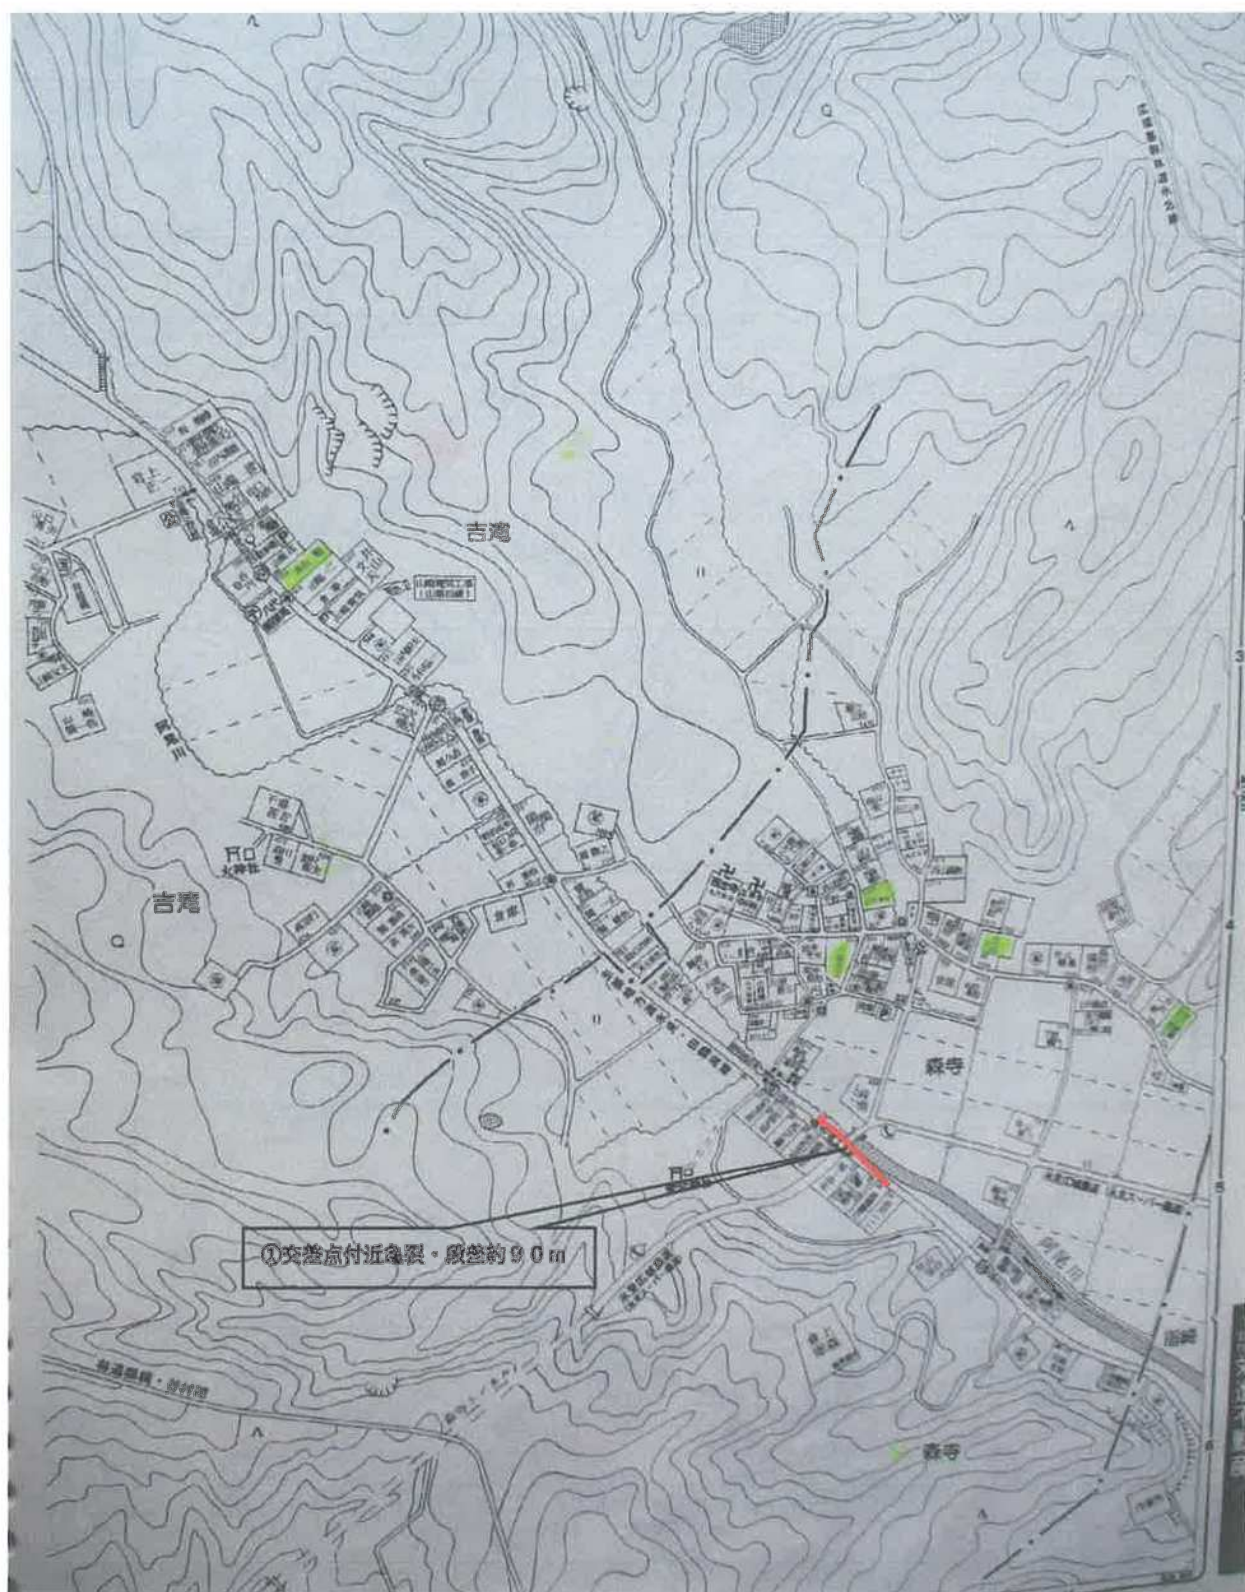

森寺 能登半島地震被災箇所 県道関係



①農道交差点付近亀裂・段差

交差点より八代側亀裂約30m




交差点農道橋段差30mm 長さ約20m

亀裂幅約20~30mm

交差点より阿尾側亀裂約40m



森寺 能登半島地震被災箇所 土地改良施設関係

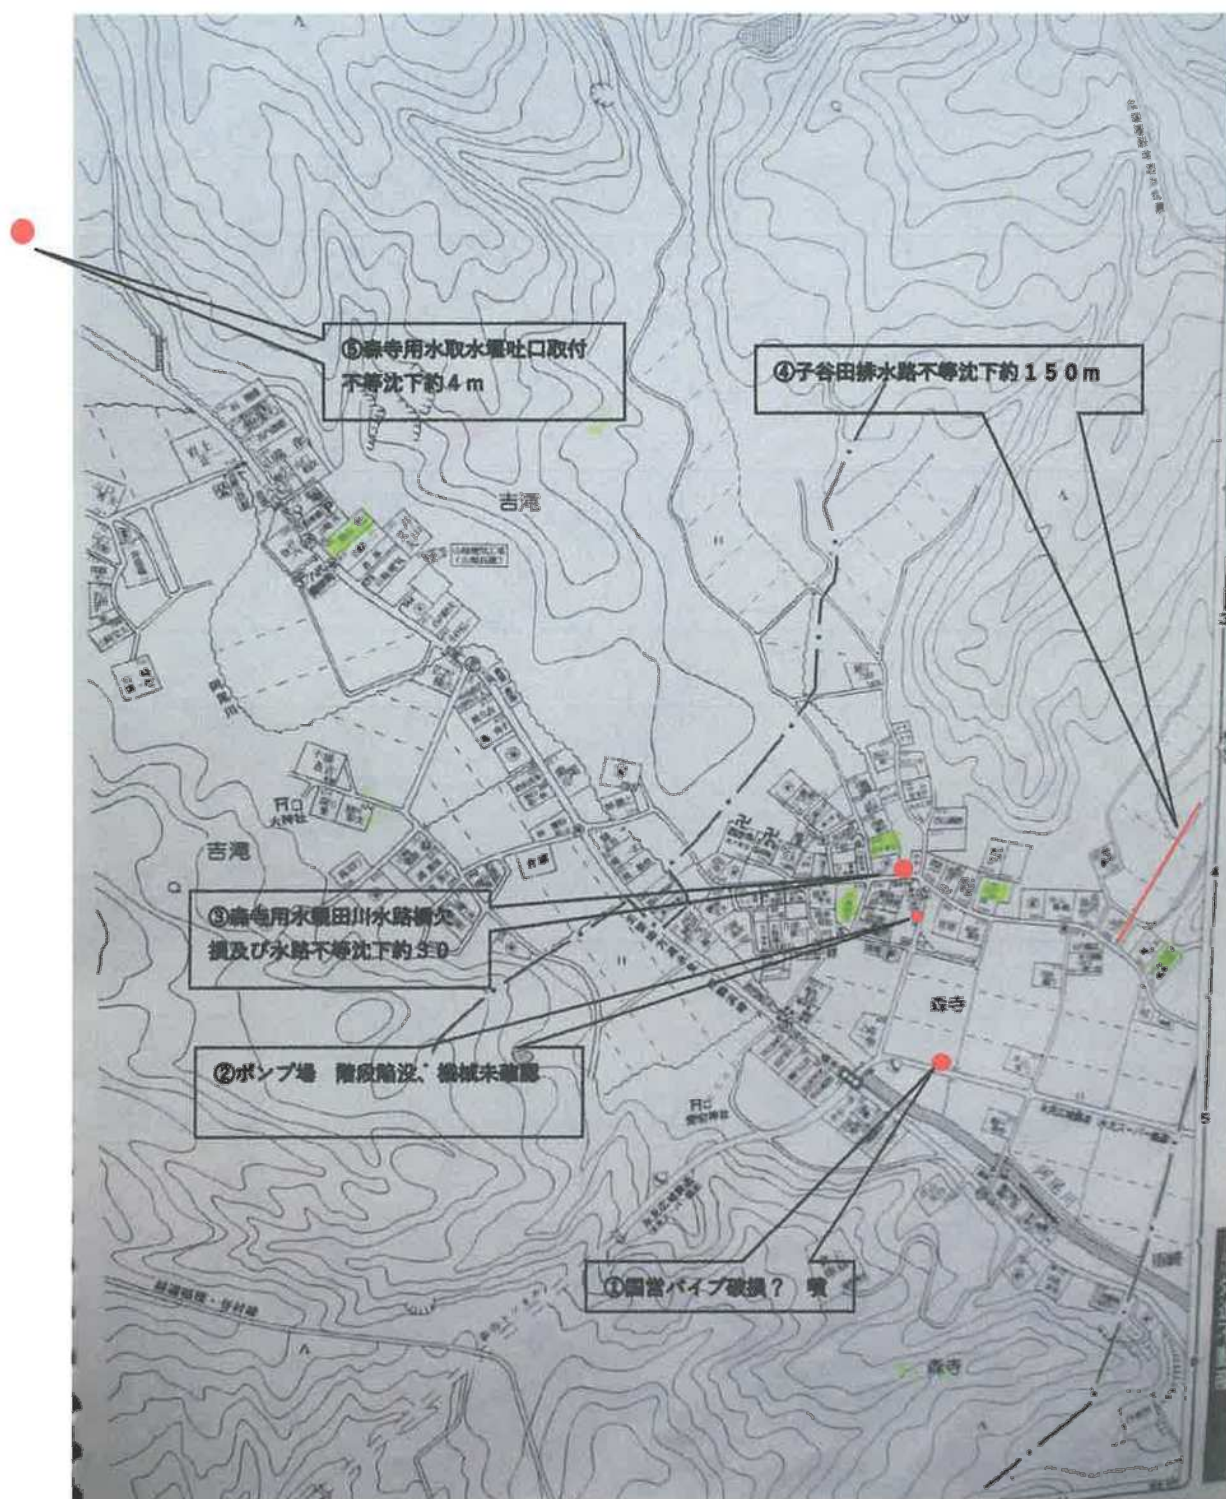

森寺 能登半島地震被災箇所 土地改良施設関係



①国営パイプ破損？
噴水箇所
広域濃度路面沈下亀裂
農道



②ポンプ場階段陥没
亀裂20mm

機械不明未確認

森寺 能登半島地震被災箇所 土地改良施設関係



③森寺用水親田川水路橋欠損
取付ボックス欠損漏水
水路橋側面亀裂より漏水
水路幅600mm



取付用水路不等沈下,漏水
約30m



※株上智調査済

森寺 能登半島地震被災箇所 土地改良施設関係




④子谷田排水路不等沈下
約150m



⑤森寺用水取水堰 吐口取付不等沈下
約4m
阿尾川へ吐口

※株上智調査済

森寺 能登半島地震被災箇所 市道・広域農道関係

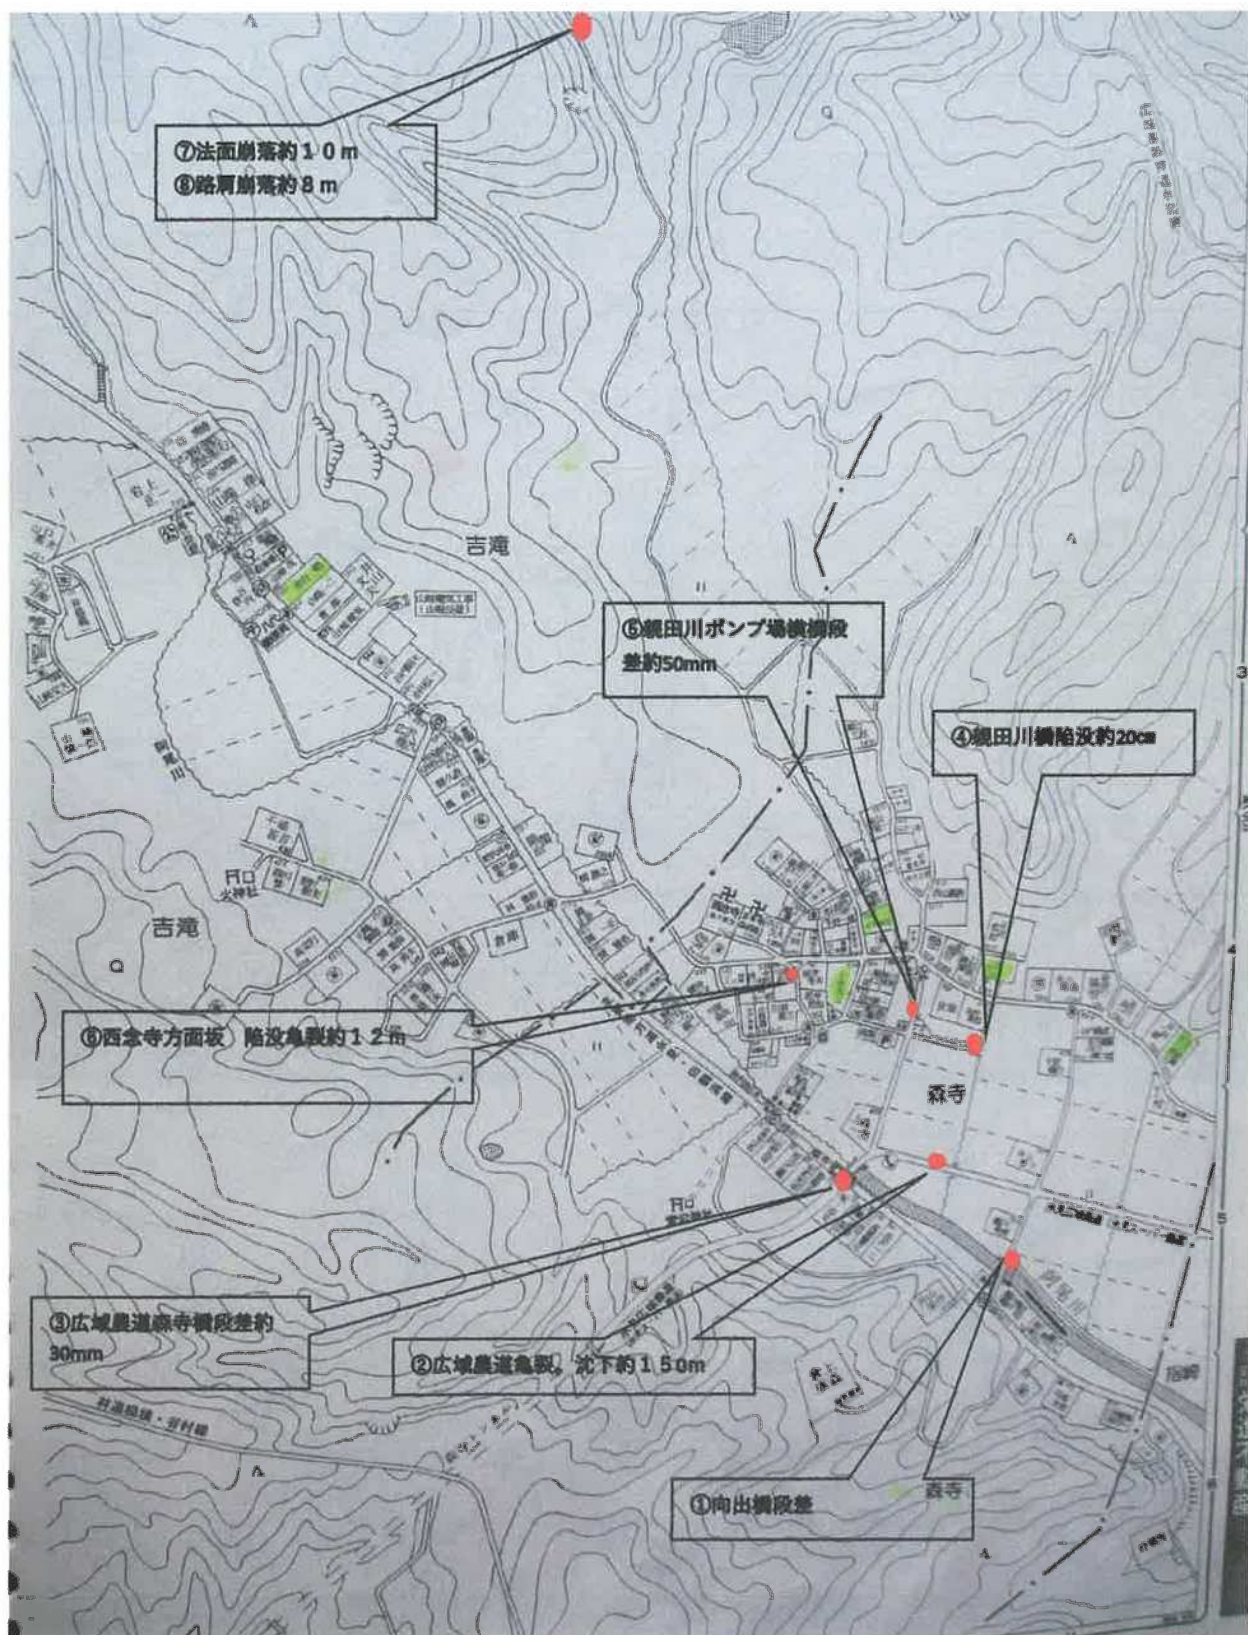

森寺 能登半島地震被災箇所 市道・広域農道関係



①向出橋段差



③広域農道森寺橋段差約30mm



④親田川橋陥没
深さ約20cm 表面亀裂30mm




森寺 能登半島地震被災箇所 市道・広域農道関係



②広域農道 亀裂・沈下約150m

沈下約30mm、亀裂幅20mm

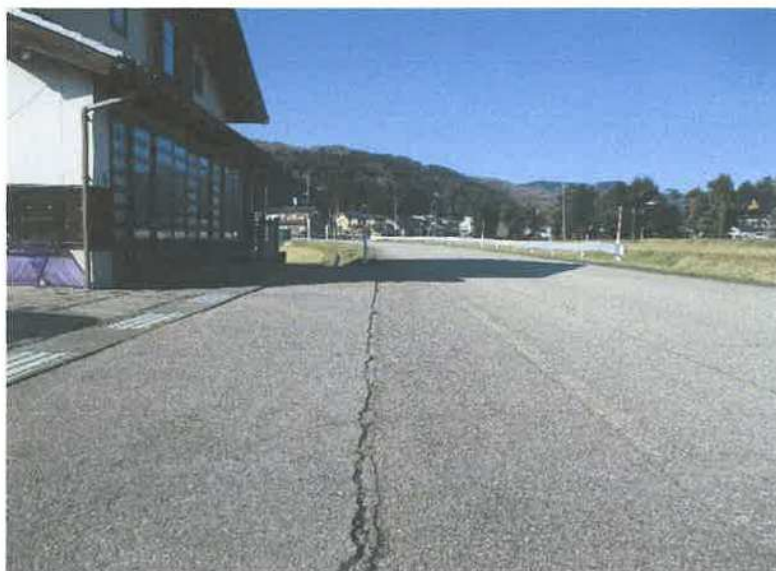

横断方向亀裂 多数



地震時噴射水 埋設国営パイプ破損？



森寺 能登半島地震被災箇所 市道・広域農道関係

⑤親田川ポンプ場横橋 段差50mm
両サイド



⑥西念寺方面坂陥没
長さ約12m
亀裂約30mm



森寺 能登半島地震被災箇所 市道・広域農道関係



⑦森寺城址方面線法面崩落
幅約10m、高さ約8m



⑧森寺城址方面線路肩崩落
長さ約8m、深さ約1.5m

森寺 能登半島地震被災箇所 公民館関係



公民館瓦

うね瓦

平瓦損傷

建物規模6×4間+2×1間



第2公民館瓦

平瓦損傷

公民館水銀灯傘落下



森寺 能登半島地震被災箇所 愛宕神社関係



①鳥居損壊



②灯籠損壊 ズレ 現状維持可能か？



狛犬ズレ
自前修繕可能か？

標柱ズレ



現状維持可能か？

森寺 能登半島地震被災箇所 その他関係

①三保池堤 倒木

